週　間　工　程　表

9

工　事　名　：　R4国道17号本庄電線共同溝工事
工 事 場 所：　埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目
工　　期：　令和4年10月1日　～　令和5年9月29日

提 出 年 月 日　　令和 5年 6月 27日
受　注　業　者　　戸田道路株式会社
現 場 代 理 人　　片野　直人
監 理 技 術 者　　北野　奉宏

月　日	先週(実施)							今週予定							来週予定							再来週予定							備　考
	6月													7月														
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工	残土搬出							残土搬出							残土搬出							残土搬出							各協議資料作成 (残土搬出は昼間作業)
電線共同溝(特殊部)		U-1	D-1		U-5			U-5	U-3																				残工事 下り線:完了 上り線:U3、5
電線共同溝(管路部)	U6～4 U6～4			雨天休工 U6～4	U6～4 U6～4			U6～4 U6～4	U4～5 U4～5	U5～3	U5～3	U3～2										U2～1	U2～1	U2～1	U2～1	U2～1			下り線:5/23～ 上り線:6/16～
情報ボックス撤去工(上り線)															U2～1	U2～1	BOX撤去 国道横断	BOX撤去 国道横断	予備日										残工事(7/3～再開) 国道横断、BOX撤去 2箇所
舗装版切断工 集水桝撤去・街渠桝撤去復旧								U4付近 集水桝撤去	U4付近 街渠桝復旧				国道横断 上下線							支道横断 下り線										国道・支道横断箇所/街渠 (電共/情報ボックス)
道路照明設備工(灯具交換) 高木撤去工																													4/8上下線　計4箇所完了 4/13高木10本撤去完了
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点																													6/17NTT国道打換終了
立会・確認 打合せ等	特殊部段階確認 大宮国道事務所 安全協議会					閉所	閉所	特殊部段階確認	管路部段階確認				休日作業	閉所	情報ボックス撤去立会					休日作業	閉所	管路部段階確認					閉所	閉所		
場所・時間		23:30～ 26:00～						22:30～ 26:00～	22:30～ 26:00～						22:30～ 26:00～	22:30～ 26:00～	22:30～ 26:00～	22:30～ 26:00～	22:30～ 26:00～			22:30～ 26:00～	22:30～ 26:00～	22:30～ 26:00～	22:30～ 26:00～	22:30～ 26:00～			計画 実施 完了
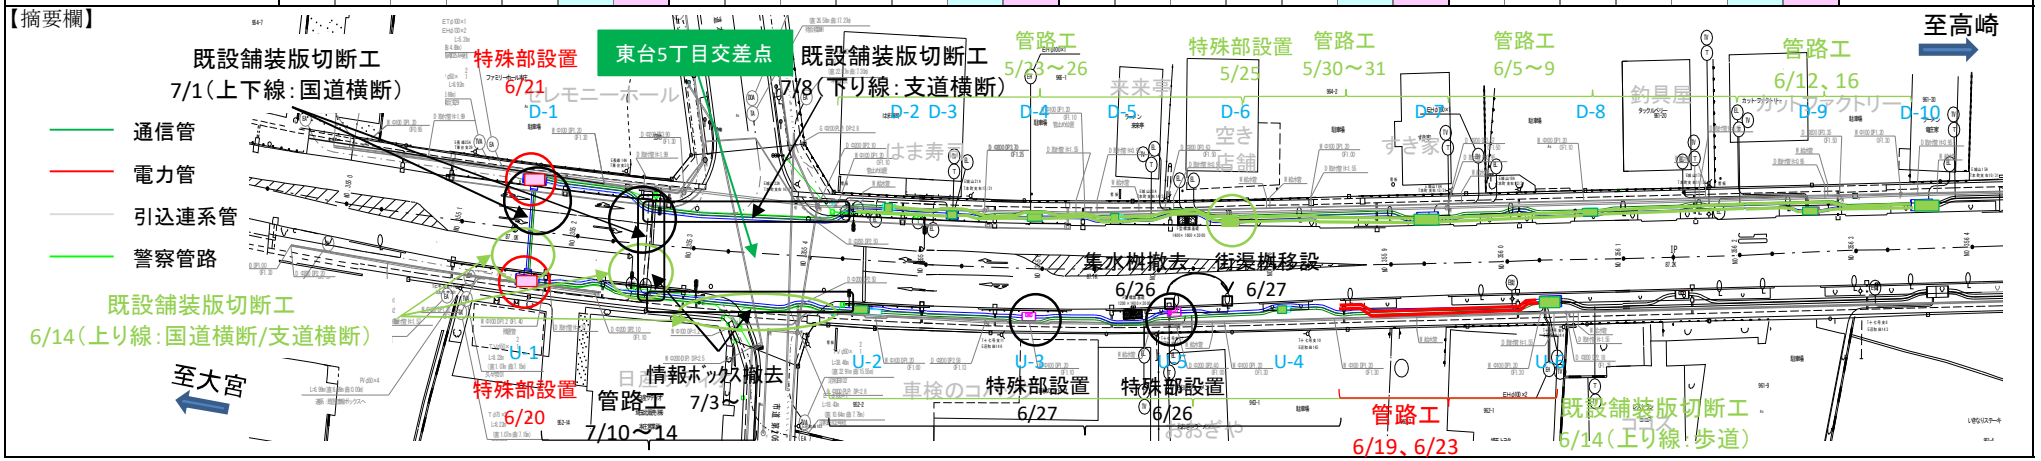
【摘要欄】
