週　間　工　程　表

工　事　名　：　R4国道17号本庄電線共同溝工事
工 事 場 所：埼玉県本庄市東台五丁目～埼玉県本庄市本庄四丁目
工　　期：令和4年10月1日　～　令和5年9月29日

提 出 年 月 日　令和 5年 9月 5日
受　注　業　者　戸田道路株式会社
現 場 代 理 人　片野　直人
監 理 技 術 者　北野　奉宏

月　日	先週(実施)							今週予定							来週予定							再来週予定							備　考
	8月							9月																				
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工 残土搬出	As塊/Co塊 残土搬出														As塊/Co塊 残土搬出 発生品搬出													【昼間作業】 As塊・Co塊・残土搬出
先行破砕(国道横断/支道横断)																													特殊部施工完了 下り線:5/25完了 上り線:6/27完了
電線共同溝(管路部) 通過試験(導通試験) 特殊部内仕上げ清掃	導通試験 (準備・確認)														【昼間作業】 信号HH部仕上・清掃 【昼間作業】導通試験							敬老の日					秋分の日		下り線:5/23～ 8/1～24 完了 上り線:6/16～7/19 完了 信号用HH/管路:8/7～31 導通試験8/10, 8/28完了
東台5丁目交差点歩道内 信号用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置・配管		信号用(下) HH/管路	信号用(下) HH/管路	信号用(下) HH/管路																									信号用HH/管路:8/7、25、29～31
【東台5丁目交差点】信号柱新設 信号・感知器立ち上げ管設置															基礎直し×3	基礎直し×1 新柱×生コン	基礎直し×3	架線 信号移設	脱枠 路面復旧										9/11～9/15(予定) 信号柱新設1箇所/立上げ管6箇所
舗装復旧工(東台5丁目交差点内)					上り線 支道横断As																								9/25～9/29(予定)
点字シート・ポストコーン設置										予備日	予備日	予備日																	9/5,6(予定)
【他企業・近接工事】 本庄市東台5丁目交差点						休み	休み						休み	休み						休み	休み	休み				休み	休み		計画 実施 完了
国道17号 片側交互規制時間	【夜間作業】21:00～翌朝5:00							【夜間作業】21:00～翌朝5:00							【昼間作業】 9:00～17:00 【夜間作業】 21:00～翌朝5:00							【夜間作業】21:00～翌朝5:00							
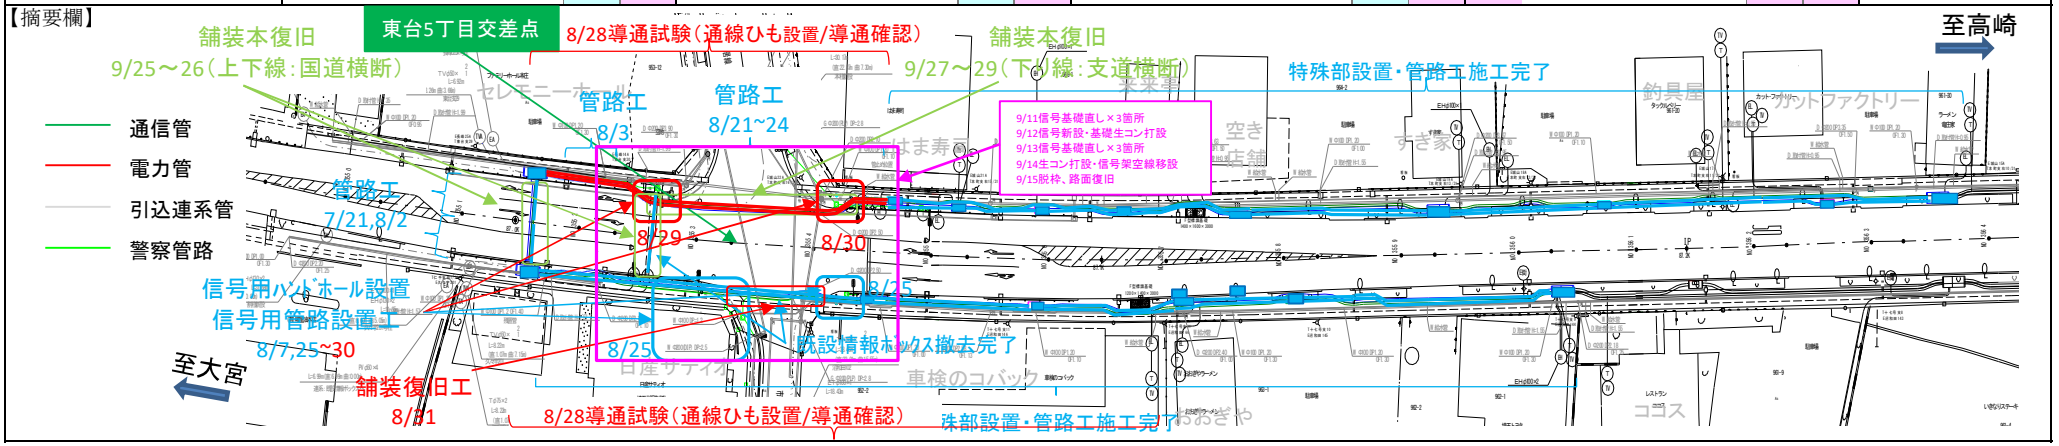
【摘要欄】
